



Ersatz der Wasserleitung in der Steinäckerstrasse sowie Sanierung der Strasse

Situation

Die Gemeindeversammlung hat am 20. November 2020 der Krediterteilung über CHF 1'135'000 zuzüglich Teuerung für den Ersatz der Wasserleitung in der Steinäckerstrasse und Sanierung der Strasse, inkl. Projektgenehmigung, zugestimmt.

Projekt

In der Steinäckerstrasse wird, im Bereich ab der Mellingerstrasse bis zum Feldweg in zwei Bauetappen, die Grauguss-Wasserleitung durch eine Kunststoffleitung ersetzt. Gleichzeitig wird auf der ganzen Länge die Strasse inkl. Gehweg, saniert. Mit dem Ersatz der Hauptwasserleitung werden ebenfalls die alten Hauszuleitungen im Strassenkörper bis zur Parzellengrenze der privaten Anstösser ersetzt. Die Strassensanierung beinhaltet neue Randabschlüsse und Einlaufschächte. Arbeiten am Kanalisationsnetz der Gemeinde sind nicht notwendig. Die Genossenschaft Elektra ergänzt ihr EW-Leitungsstrasse und die Regionalwerke AG Baden ihr Gasleitungsnetz.

Projektstand per 2. September 2021


Werkleitungsbau

Sämtliche Wasserleitungen sind verlegt und in Betrieb.

Strassenbau

Die Bauunternehmung Birchmeier Bau AG hat die Randabschlüsse demnächst fertig gestellt. Dies ermöglicht, dass voraussichtlich am 9. September 2021, von der Mellingerstrasse bis zu Kreuzung Steinäcker-, Bollstrasse die letzte Belagsetappe (Tragschicht) und unmittelbar danach auf die noch heisse Tragschicht der Deckbelag eingebaut werden kann. Der Deckbelag wird über die Kreuzung Steinäcker-, Bollstrasse eingebaut, so dass diese vor dem finalen Deckbelagseinbau am 21. September 2021 bis zum Feldweg befahrbar ist. Im Anschluss folgen die Fertigstellungsarbeiten.

Übersichtsplan Projektperimeter

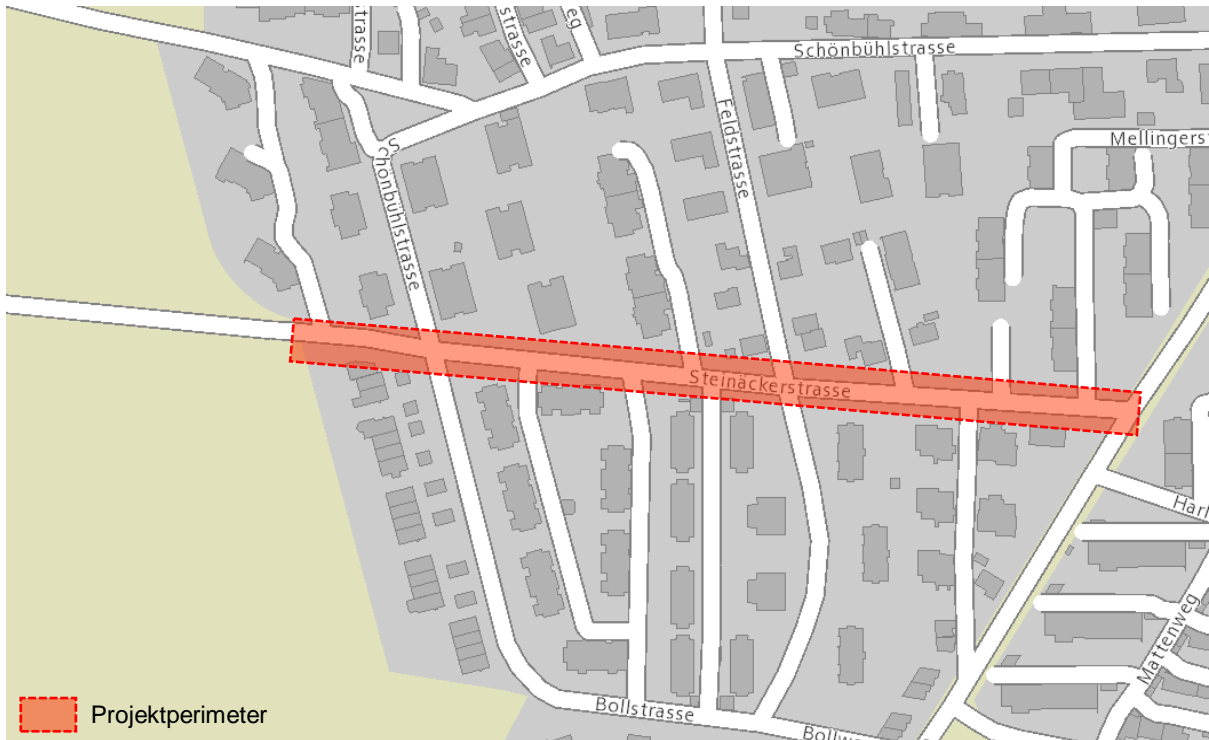

Projektbeteiligte

Bauleitung	Meiler, Huguenin AG, Spreitenbach
Bauunternehmung	Birchmeier Gruppe, Döttingen
Rohrlegearbeiten Wasser	Gebr. Meier AG, Birrhard
Rohrlegearbeiten Gas	Regionalwerke AG Baden

Zeitplan

Termin	Aktivität
20. November 2020	Krediterteilung an der Gemeindeversammlung
Ostern 2021	Baubeginn
Anfangs Juli 2021	Ende Werkleitungsarbeiten
Anfangs September 2021	Ende der Hauptarbeiten
Anfangs Oktober 2021	voraussichtliches Bauende
